

Fall fra stillas i sjakt – manglende låsemekanisme

02.02.2026

Hva har skjedd (*fakta*)


En riggmann er på befarings i stillas for å se etter is-svuller i sjaktvegger. Han lener seg mot rekkverk i CU3, rekkverket gir etter og han faller 6,6 meter ned til ett betongutstikk i CU5..Klatrer herfra tilbake på stillas og tilkaller hjelp fra kollegaer. 113 tilkalles ikke, da riggarbeider er tydelig på at han ikke har brukt noe og ikke ønsker ambulanse. Han går selv opp til riggkontor. Leder blir varslet og når han ankommer blir det bestemt at riggarbeider skal på legevakt for sjekk. Leder kjører selv den skadede til legevakt, med veiledning over telefon fra disse, som mobiliserer traumeteam.

Utrolig nok endte fallet med et kraftig forslått venstre lår og arm. Personen blir sykmeldt i ca 2 uker og er deretter tilbake i jobb.

Årsak og konsekvens

Rekkverksrammen til stillaset manglet obligatoriske låsefjærer som gjorde at den kunne falle ut av sporene sine. Kontroll etter hendelsen viste at flere rekkverksdeler manglet obligatoriske låsemekanismer. Dette ble ikke oppdaget ved montasje, overlevering og senere periodiske kontroller av stillasleverandør. Sjekkliste fra stillasfirmaet hadde ikke punkt om obligatoriske låsemekanismer på rekkverk.

Personen hadde ikke brukerkurs for stillas, og hadde ikke kompetanse til å se risikoen ved manglende sikkerhetskritiske funksjoner.

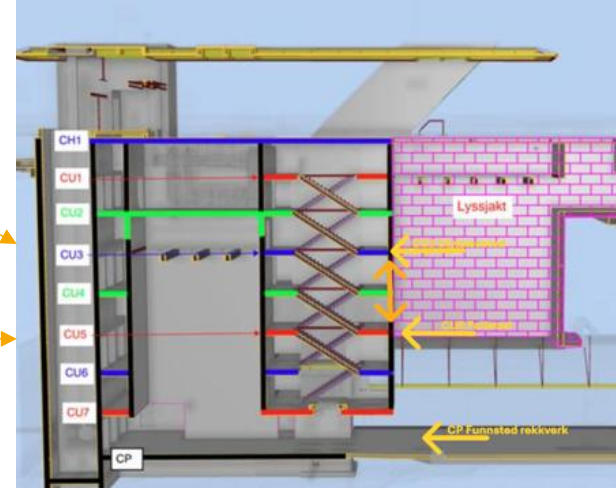

Læring og tiltak

- Ring 113 ved fall fra høyde. Manglet kunnskap om håndtering av fallulykker og risiko for indre skader.
- Umiddelbar aksjon på alle byggeplasser med sjekk av stillas og sikringsmekanismer.
- Ved montering og re-sjekk av stillas, skal det alltid være sjekkpunkt for sikkerhetskritiske funksjoner, herunder obligatoriske låsemekanismer på rekkverk. Monteringsveiledning beskriver hvilken type lås som skal benyttes til hvilket komponent. Vær oppmerksom på sammenblanding av komponenter fra forskjellige systemer, opp mot monteringsveiledning.
- Mottakskontroll av utstyr fra stillasleverandør før montering dokumenteres. Kasseringsrutiner følges opp.

Oppfølging fra Hovedbedrift: - Det skal være trygt å gå i et stillas

- Gjennomgang av stillasmontasjen sammen med montør, før overtakelse.
- Ansvarsforhold rundt modifisering og reetablering av stillas må tydelig defineres i HBs organisasjon.
- Etablere hyppige streifrunder (1-2 dagers mellomrom) med kontroll av kantsikringer, trapper, gulv og veggsikringer, i tillegg til vernerunden.
- Kontroll av brukerkurs for stillas før oppstart arbeid.

